

生产时效监控



生产单 PO-202610-0101

演示款蓝白印花衬衫 · SPU-SHIRT-086 · 跟单陈静 · 1张采购单 / 查看起算依据

业务核实截至 10-07 09:00 (演示)
假设演示 · 三种合同同屏

全部入成衣仓截止 · 最早采购下单 + 28自然日

2026-10-18 09:00

还剩11天；预计全量入仓时间未取得

成衣仓已入库 / 应完成

480 / 1500件

剩余1020件需入库

当前优先处理

B厂 SWT-B-01-0101 · 30%节点欠150件

陈强执行 → 李梅接收；该合同节点未达标 · 已超时9小时；下一节点70%
截止10-09 23:59

数量现在在哪里

应完成1500件 · 以下数量互不重复



1500 = 后道未实收720 + 后道处理中150 + 交出待收150 + 已入库480件

生产准备

已完成 · 按期

要求完成 2026-09-24 09:00；实际完成 09-24 09:00

阶段整体4自然日；支线不累加

展开详情 ↓

面辅料供给

3个采购批已按期入仓

采购到面辅料仓8自然日；加工 / 交接另计

展开详情 ↓

裁片辅助工艺

5道辅助工艺已按期完成

辅助工艺每道3自然日；交接另计

主裁床1000件对应裁片 (A800 + C200)；B500承包裁剪见车缝执行

展开详情 ↓

车缝任务分配

已分配 3个任务 · 按合同分别跟进

实际分配 09-30 至 10-03；合同累计回货要求从各任务业务分配日起算

查看分配合同与执行链路 ↓

车缝执行

1个任务回货节点未达标 · 已超时，最长9小时

4项执行中 2项尚未开始

实际开始 09-30 10:10
进行中最长已用6天22小时50分钟
时效要求未确认6项 · 无法判定是否超时

加工用时与合同回货节点分开

查看阶段图与对应单据 ↓

后道

加工中 150件

已交出待入仓 150件

成衣仓已入库 480件

实际开始 10-03 16:01 · 最近完成 10-06 15:45
进行中最长已用18小时50分钟；已完成最长耗时1天17小时40分钟
时效要求未确认14项 · 无法判定是否超时

加工与交接分别计时

查看阶段图与对应单据 ↓

收起全部阶段链路

点击阶段查看具体工作和单据

工作 / 任务 · 点击查看	09-20 D0	09-24 D4	09-28 D8	10-07 查看时点	10-18 D28	执行与交接责任 / 下一动作
生产准备 6条准备链路 · 阶段整体4天	要求4天 准备完成 09-24 09:00					张琳执行 · 陈静完成确认 收起生产准备链路

已完成 · 按期

要求完成 2026-09-24 09:00；实际完成 09-24 09:00

阶段整体4自然日；支线不累加

生产准备 · 单据与交接链路

生产准备单、BOM物料明细、前期输入及适用任务；无定位印，整体要求4天

收起本阶段链路 ↑

生产准备单

✓ 已完成 · 按期

截止 09-24 09:00 · 实际完成 09-24 09:00

■ 演示PP-0086-101

准备已完成（单据已关闭） · 1单

准备完成 / 单据关闭 09-24 09:00

开始 09-20 09:00

准备阶段 耗时4天 · 要求4自然日

技术张琳 → 跟单陈静

BOM物料明细

■ 演示PP-0086 · BOM明细-101

已确认 · 5项

确认 09-20 09:05

张琳 → 买手陈静

设计改款任务

■ 演示DR-086-101

已完成 · 1套

确认 09-19 17:00

版师梁敏 → 技术张琳

F01 主面料 · 蓝底

C01 · 技术调色准备

颜色要求

■ 演示PP-0086 · BOM明细-101

已确认 · 5项

→

工厂调色 / 交出色样

■ 演示COLOR-C01-101

已完成 · 1色样

制作 09-21 09:00 → 09-22 14:40

制作 耗时1天5小时40分钟 · 要求未确认

交接 09-22 15:00 → 09-22 15:30

交接 耗时30分钟 · 要求未确认

染厂阿迪执行 → 技术张琳接收确认

→

成果接收 / 确认

■ 演示COLOR-C01-101

已完成 · 1色样

确认 09-23 10:00

染厂阿迪执行 → 技术张琳接收确认

C02 · 技术调色准备

■ 演示PP-0086 · BOM明细-101



■ 演示COLOR-C02-101

制作 09-21 09:00 → 09-22 14:30

■ 演示COLOR-C02-101

确认 09-22 17:00

P01 · 印花技术准备

■ 演示PP-0086 · BOM明细-101



■ 演示ART-P01-101

制作 09-21 10:00 → 09-22 15:40

■ 演示ART-P01-101

确认 09-23 11:00

P02·印花技术准备

■ 演示PP-0086 · BOM明细-101



■ 演示ART-P02-101

制作 09-21 10:00 → 09-22 15:30



■ 演示ART-P02-101

确认 09-23 12:00

適用成果汇合 →

■ 演示TP-TASK-086-101

正式技术包
确认 09-24 08:30
适用有效明细全部完成后汇合；未
■ 演示 IP-086-V11-101
启用 / 需求变更结束项不计当前未
已发布：1版本
完成工作。

发布 09-24 09:00

张琳汇总 → 陈静发布



面辅料供给

5项物料 · 库存/补采分
别跟进

5项物料 · 展开看各自实收与加工单

赵敏采购 → 对应仓库实收确认
收起面辅料供给链路

3个采购批已按期入仓

采购到面辅料仓8自然日；加工 / 交接另计

面辅料供给 · 单据与交接链路

收起本阶段链路 ↑

每项物料先看需求和来源，按下游实收汇合，再按实际全量或分批加工单推进

主面料白坯布

物料 F01

需求 1500米

主身 / 袖口 · 蓝底花型A/B

= 库存采用 600米 + 补采 900米

① 库存采用
600米

下单时库存 600米

原料调拨单

■ 演示TR-F01-STOCK-101

已接收 · 600米
下游接收 09-26 12:00
交出 09-26 11:00
交接 耗时1小时 · 要求未确认
面料仓周婷 → 染色厂阿迪

② 缺口补采
900米

国内采购

物料采购单

✓ 已入仓 · 按期

截止 09-28 12:00 · 实际入仓 09-26 10:00

■ 演示MP-F01-101

已收齐入库 · 900米
仓库入库 09-26 10:00
下单 09-20 12:00
采购到仓 耗时5天22小时 · 要求8自然日
采购赵敏 → 面料仓周婷

→

原料入库单

■ 演示IN-F01-101

已入库 · 900米
接收入库 09-26 10:00
面料仓周婷 → 面料仓周婷

→

原料调拨单

■ 演示TR-F01-PURCHASE-101

已接收 · 900米
下游接收 09-26 12:10
交出 09-26 11:10
交接 耗时1小时 · 要求未确认
面料仓周婷 → 染色厂阿迪

→

染色厂阿迪已实收
1500米

600 + 900 = 1500
米
09-26 12:10

↓ 本例采用全量加工单；实际可按已接收批次分别推进；各道数量分别记录



1 · 大货染色加工单

大货染色加工单

■ 演示WO-F02-DYE-101

加工完成 · 150米

加工完成 09-25 16:00

开始 09-24 10:00

加工 耗时1天6小时 · 要求未确认

染色厂阿迪 → 裁床刘军

↓ 交出与下游实收

染色厂阿迪 → 裁床刘军

已接收

■ 演示HO-F02-DYE-101

■ 交出记录

■ 接收记录

■ 质检交接记录

交出 09-25 16:10 · 150米

实收 09-25 16:40 · 150米 · 差异0米

交接 耗时30分钟 · 要求未确认

纽扣 物料 A01

蓝白款配套 · 无后续加工

需求 9000粒

= 库存采用 9000粒 + 补采 0粒

⓪ 库存采用
9000粒

下单时库存 9000
粒

原料调拨单

■ 演示TR-A01-STOCK-101

已接收 · 9000粒

下游接收 09-20 16:00

交出 09-20 15:30

交接 耗时30分钟 · 要求未确认

辅料仓周婷 → 裁床配料林芳

⇒

裁床配料林芳已
实收

9000粒

9000 = 9000粒

09-20 16:00

✓ 无需大货加工 · 实收后进入对应配料工作

衬布 物料 A02

领 / 门襟 · 无后续加工

需求 300米

= 库存采用 0米 + 补采 300米

② 缺口补采
300米
印尼本地采购

物料采购单

✓ 已入仓 · 按期

截止 09-28 14:00 · 实际入仓 09-25 11:00

■ 演示MP-A02-101

已收齐入库 · 300米
仓库入库 09-25 11:00
下单 09-20 14:00
采购到仓 耗时4天21小时 · 要求8自然日
采购赵敏 → 辅料仓周婷

→

原料入库单

■ 演示IN-A02-101

已入库 · 300米
接收入库 09-25 11:00
辅料仓周婷 → 辅料仓周婷

→

原料调拨单

■ 演示TR-A02-PURCHASE-101

已接收 · 300米
下游接收 09-25 12:10
交出 09-25 11:10
交接 耗时1小时 · 要求未确认
辅料仓周婷 → 裁床配料林芳

⇒

裁床配料林芳已
实收

300米

300 = 300米
09-25 12:10

✓ 无需大货加工 · 实收后进入对应配料工作

织标 物料 A03

本款织标 · 无后续加工

需求 1500个

= 库存采用 500个 + 补采 1000个

① 库存采用
500个
下单时库存 500个

原料调拨单

■ 演示TR-A03-STOCK-101

已接收 · 500个
下游接收 09-27 16:00
交出 09-27 15:30
交接 耗时30分钟 · 要求未确认
辅料仓周婷 → 裁床配料林芳

→

裁床配料林芳已
实收

1500个

500 + 1000 = 1500
个

物料采购单

✓ 已入仓 · 按期

→

原料入库单

■ 演示IN-A03-101

已入库 · 1000个

→

原料调拨单

■ 演示TR-A03-PURCHASE-101

已接收 · 1000个

② 缺口补采
1000个

自有辅料工厂

截止 09-28 15:00 · 实际入仓 09-27 15:00

■ 演示MP-A03-101

已收齐入库 · 1000个
仓库入库 09-27 15:00
下单 09-20 15:00

采购到仓 耗时7天 · 要求8自然日

采购赵敏 → 辅料仓周婷

→

接收入库 09-27 15:00
辅料仓周婷 → 辅料仓周婷

→

下游接收 09-27 16:10
交出 09-27 15:10

交接 耗时1小时 · 要求未确认

辅料仓周婷 → 裁床配料林芳

09-27 16:10

✓ 无需大货加工 · 实收后进入对应配料工作

白坯布是加工前原料；蓝底、花型A/B是目标效果。以实际接收记录为准，米、粒、个分别核对。
整单原料已集中接收；各合同实际物料分拨明细待核实。

裁剪 / 辅助工艺	4个部位 · 单道/多道分别跟进					刘军裁剪 · 陈静人工放行 收起裁片辅助工艺链路
— 4个部位 · 无需/单道/多道						

5道辅助工艺已按期完成

辅助工艺每道3自然日；交接另计

主裁床1000件对应裁片（A800+C200）；B500承包裁剪见车缝执行

裁片辅助工艺 · 单据与交接链路

每个部位 / 批次有裁剪单，逐道加工单与工厂质检交接记录；辅助工艺每道3自然日

收起本阶段链路 ↑

前片 · 1000片

CUT-F-01

多道 · 绣花→打揽

裁剪单

■ 演示CUT-CUT-F-01-101

本部位已裁出 · 1000片
裁剪完成 09-28 20:00
裁床刘军 → 陈静 / 下游工厂

绣花加工单

✓ 已完成 · 按期

截止 10-01 20:30 · 实际完成 09-29 06:00

■ 演示AUX-CUT-F-01-EMB-101

→

裁床刘军 → 绣花厂阿琳

已接收

■ 演示HO-CUT-F-01-FIRST-101

■ 交出记录

■ 接收记录

■ 质检交接记录

交出 09-28 20:05 · 1000片
实收 09-28 20:20 · 1000片 · 差异0片

交接 耗时15分钟 · 要求未确认

→

绣花厂阿琳 → 打揽厂阿迪

已接收

■ 演示HO-CUT-F-01-EMB-101

■ 交出记录

■ 接收记录

■ 质检交接记录

交出 09-29 06:10 · 1000片
实收 09-29 06:40 · 1000片 · 差异0片

交接 耗时30分钟 · 要求未确认

后片 · 1000片 CUT-B-01 单道 · 绣花	加工完成 · 1000片 加工完成 09-29 06:00 开始 09-28 20:30 加工 耗时9小时30分钟 · 要求3自然日 绣花厂阿琳 → 打揽厂阿迪 ↓ 下一道加工起点以本批实际接收及加工单为准 打揽加工单 ✓ 已完成 · 按期 截止 10-02 07:00 · 实际完成 09-29 12:00 ■ 演示AUX-CUT-F-01-SMOCK-101 加工完成 · 1000片 加工完成 09-29 12:00 开始 09-29 07:00 加工 耗时5小时 · 要求3自然日 打揽厂阿迪 → 裁床刘军	
	打揽厂阿迪 → 裁床刘军 已接收 ■ 演示HO-CUT-F-01-SMOCK-101 ■ 交出记录 ■ 接收记录 ■ 质检交接记录 交出 09-29 12:10 · 1000片 实收 09-29 12:40 · 1000片 · 差异0片 交接 耗时30分钟 · 要求未确认 →	
	裁剪单 ■ 演示CUT-CUT-B-01-101 本部位已裁出 · 1000片 裁剪完成 09-28 20:00 裁床刘军 → 陈静 / 下游工厂 →	裁床刘军 → 绣花厂阿琳 已接收 ■ 演示HO-CUT-B-01-FIRST-101 ■ 交出记录 ■ 接收记录 ■ 质检交接记录 交出 09-28 20:05 · 1000片 实收 09-28 20:20 · 1000片 · 差异0片 交接 耗时15分钟 · 要求未确认 →
	绣花加工单 ✓ 已完成 · 按期 截止 10-01 20:30 · 实际完成 09-29 09:00 ■ 演示AUX-CUT-B-01-EMB-101 加工完成 · 1000片 加工完成 09-29 09:00 开始 09-28 20:30 加工 耗时12小时30分钟 · 要求3自然日 绣花厂阿琳 → 裁床刘军 →	绣花厂阿琳 → 裁床刘军 已接收 ■ 演示HO-CUT-B-01-EMB-101 ■ 交出记录 ■ 接收记录 ■ 质检交接记录 交出 09-29 09:10 · 1000片 实收 09-29 09:40 · 1000片 · 差异0片 交接 耗时30分钟 · 要求未确认

袖片 · 2000片

CUT-S-01

多道 · 模版机→绣花

裁剪单

■ 演示CUT-CUT-S-01-101

本部位已裁出 · 2000片
裁剪完成 09-28 20:00
裁床刘军 → 陈静 / 下游工厂



裁床刘军 → 模版机厂林梅

已接收

■ 演示HO-CUT-S-01-FIRST-101

■ 交出记录

■ 接收记录

■ 质检交接记录

交出 09-28 20:05 · 2000片
实收 09-28 20:20 · 2000片 · 差异0片
交接 耗时15分钟 · 要求未确认

模版机加工单

✓ 已完成 · 按期

截止 10-01 20:30 · 实际完成 09-29 08:00

■ 演示AUX-CUT-S-01-TEMPLATE-101

加工完成 · 2000片
加工完成 09-29 08:00
开始 09-28 20:30
加工 耗时11小时30分钟 · 要求3自然日
模版机厂林梅 → 绣花厂阿琳



模版机厂林梅 → 绣花厂阿琳

已接收

■ 演示HO-CUT-S-01-TEMPLATE-101

■ 交出记录

■ 接收记录

■ 质检交接记录

交出 09-29 08:10 · 2000片
实收 09-29 08:40 · 2000片 · 差异0片
交接 耗时30分钟 · 要求未确认

↓ 下一道加工起点以本批实际接收及加工单为准

绣花加工单

✓ 已完成 · 按期

截止 10-02 09:00 · 实际完成 09-29 13:00

■ 演示AUX-CUT-S-01-EMB-101

加工完成 · 2000片
加工完成 09-29 13:00
开始 09-29 09:00
加工 耗时4小时 · 要求3自然日
绣花厂阿琳 → 裁床刘军



绣花厂阿琳 → 裁床刘军

已接收

■ 演示HO-CUT-S-01-EMB-101

■ 交出记录

■ 接收记录

■ 质检交接记录

交出 09-29 13:10 · 2000片
实收 09-29 13:40 · 2000片 · 差异0片
交接 耗时30分钟 · 要求未确认

领片 · 1000片

CUT-C-01

无需辅助工艺

裁剪单

■ 演示CUT-CUT-C-01-101

本部位已裁出 · 1000片
裁剪完成 09-28 19:00

无需辅助工艺 → 仍由业务人员人工放行

裁床刘军 → 陈静 / 下游工厂

业务人员人工放行

裁片放行记录

■ 演示REL-1000-101

已人工放行 · 1000件成衣对应范围

接手确认 09-29 14:10

跟单陈静 → PPIC王明

主裁床1000件对应裁片（A800+C200）；B500承包裁剪见车缝执行

上道工厂交出与下道实际接收分别记录。无需工艺也不自动视为已放行；片数不相加为成衣完成量。

· 车缝任务分配 已分配 A厂 SWT-A-01-0101 · 分配 09-30 00:00 B厂 SWT-B-01-0101 · 分配 10-01 00:00 B厂 SWT-C-01-0101 · 分配 10-03 00:00 王明分配 → 承包工厂确认 查看分配合同					
— 车缝执行 3个任务 · 按承包范围展开 4项进行中 2项尚未开始 实际开始 09-30 10:10 进行中最长已用6天22小时50分钟 时效要求未确认6项 · 无法判定是否超时 承包工厂执行 → 接收责任人确认 收起车缝执行链路					

车缝任务分配与车缝执行 · 单据与交接链路

收起本阶段链路 ↑

A厂 · SWT-A-01-0101

车缝+烫包

工厂实领 800件 · 合同从业务分配日起算

① 车缝任务分配

车缝任务分配合同

■ 演示ALLOC-SWT-A-01-101

回货跟进中 · 800件

最后后道实收 10-06 14:00

赵亮 → 李梅

工厂实领

800件

后道实收

720件

② 车缝执行 · 分别记录实际开始与完成

车缝

烫包

承包工厂烫包

车缝执行单

■ 演示FF-execution-SWT-A-01-0101-sew

制作中

车缝开始 09-30 10:10

车缝 已用6天22小时50分钟 · 要求未确认

赵亮 → 王明

应完成

800件

已完成

720件

未完成

80件



工厂烫包执行单

■ 演示FF-execution-SWT-A-01-0101-pack

分批烫包中

烫包开始 10-03 15:40

烫包 已用3天17小时20分钟 · 要求未确认

赵亮 → 王明

应完成

800件

已完成

720件

未完成

80件

B厂 · SWT-B-01-0101 裁剪+车缝+烫包 工厂实领 500件 · 合同从业务分配日起算

车缝任务分配合同

■ 演示ALLOC-SWT-B-01-101

回货跟进中 · 500件

工厂实领 10-01 10:00

陈强 → 李梅

① 车缝任务分配

工厂实领

500件

后道实收

0件

② 车缝执行 · 分别记录实际开始与完成

裁剪

承包裁剪执行单

■ 演示FF-execution-SWT-B-01-0101-cut

裁剪中

裁剪开始 10-01 10:10

裁剪 已用5天22小时50分钟 · 要求未确认

陈强 → 王明

应完成

500件

已完成

0件

未完成

500件



车缝

车缝执行单

■ 演示FF-execution-SWT-B-01-0101-sew

尚未开始

开始 尚未发生

车缝尚未开始 · 未开始计时

陈强 → 王明

应完成

500件

已完成

0件

未完成

500件



烫包

承包工厂烫包

工厂烫包执行单

■ 演示FF-execution-SWT-B-01-0101-pack

尚未开始

开始 尚未发生

烫包尚未开始 · 未开始计时

陈强 → 王明

应完成

500件

已完成

0件

未完成

500件

B厂 · SWT-C-01-0101 独立车缝 工厂实领 200件 · 合同从业务分配日起算

① 车缝任务分配

车缝任务分配合同

■ 演示ALLOC-SWT-C-01-101

回货跟进中 · 200件

最后后道实收 10-06 15:00

陈强 → 李梅

工厂实领

200件

后道实收

60件

② 车缝执行 · 分别记录实际开始与完成

车缝

车缝执行单

■ 演示FF-execution-SWT-C-01-0101-sew

制作中

车缝开始 10-03 10:10

车缝 已用3天22小时50分钟 · 要求未确认

陈强 → 王明

应完成

200件


已完成

60件

未完成

140件

回货进度以本任务后道实收为准；加工与交接分别计时。

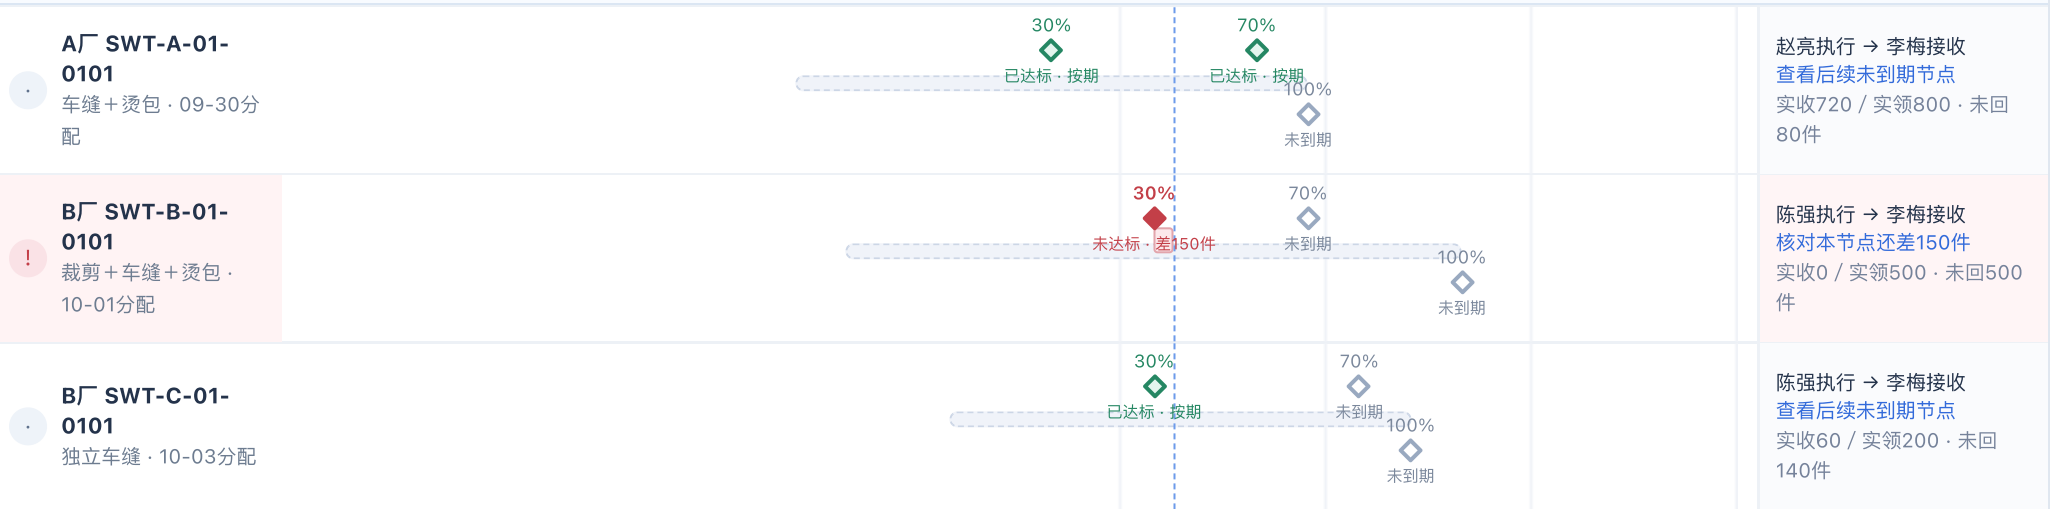

后道

已进入

11项已完成

实际开始 10-03 16:01 · 最近完成 10-06 15:45

进行中最长已用18小时50分钟；已完成最长耗时1天17小时40分钟

时效要求未确认14项 · 无法判定是否超时

3项进行中

后道执行与交接责任见具体单据

收起后道链路

后道 · 单据与交接链路

收起本阶段链路 ↑

后道工作	09-20 采购下单	10-07 查看时点				10-18 入库截止	执行与交接责任
后道质检 · 各批加工与交接分别计时	实际开始 10-03 16:01 · 实际完成 10-06 15:05 已完成最长耗时4分钟 时效要求未确认5项 · 无法判定是否超时	5项已完成					质检人员执行 → 后道确认 查看对应批次单据
后道加工 · 各批加工与交接分别计时	2项已完成 实际开始 10-03 16:06 · 最近完成 10-06 15:40 进行中最长已用18小时50分钟；已完成最长耗时1小时30分钟 时效要求未确认4项 · 无法判定是否超时	2项进行中					适用项目执行 → 后道确认 查看对应批次单据
后道复检 · 各批加工与交接分别计时	实际开始 10-03 16:15 · 实际完成 10-06 15:45 已完成最长耗时4分钟 时效要求未确认2项 · 无法判定是否超时	2项已完成					SKU数量 / 条码复核 → 交货确认 查看对应批次单据
后道交货 · 各批加工与交接分别计时	2项已完成 实际开始 10-03 16:20 · 最近完成 10-05 10:00 进行中最长已用17小时；已完成最长耗时1天17小时40分钟 时效要求未确认3项 · 无法判定是否超时	1项待接收 · 已用17小时					后道交出 → 成衣仓实收确认 查看对应批次单据

A-03-1 · 150件

已交出待入仓

来源任务 SWT-A-01-0101

① 后道收货

② 质检

③ 后道加工单

④ 处理后交出复核

⑤ 交货 / 实际交出

⑥ 成衣仓接收

本单后道项目

开扣眼

装扣子

成衣仓尚未接收 · 入库单尚未生成

后道实收记录

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-A-03-1-receive

已实收
后道实收 10-06 14:00
赵亮 → 后道李梅

本批次实收
150件

来源记录实收
240件

后道质检单

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-A-03-1-qc

质检完成
质检完成 10-06 14:05
开始 10-06 14:01
质检 耗时4分钟·要求未确认
质检陈芳 → 后道李梅

应检
150件

已检
150件

合格
150件

不合格
0件

后道加工单

■ 演示POST-SWT-A-01-0101-A-03-1

后道完成
后道完成 10-06 15:40
开始 10-06 14:10
加工 耗时1小时30分钟·要求未确认
后道吴芳 → 后道李梅

应处理
150件

已处理
150件

已确认未处理
0件

后道复检单

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-A-03-1-recheck

复检完成
复检完成 10-06 15:45
开始 10-06 15:41
数量与条码复核 耗时4分钟·要求未确认
复检周燕 → 后道李梅

应交出
150件

复核交出
150件

数量差异
0件

后道交货单

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-A-03-1-delivery

已交出待接收
后道交出 10-06 16:00
交接 待收已用17小时·要求未确认
后道李梅 → 成衣仓周婷

应交
150件

实交
150件

实收
0件

已入库-2·240件

成衣仓已入库

来源任务 SWT-A-01-0101

① 后道收货

后道实收记录

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-已入库-2-receive

已实收
后道实收 10-03 16:00
赵亮 → 后道李梅

本批次实收
240件

来源记录实收
240件

② 质检

后道质检单

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-已入库-2-qc

质检完成
质检完成 10-03 16:05
开始 10-03 16:01
质检 耗时4分钟·要求未确认
质检陈芳 → 后道李梅

应检
240件

已检
240件

合格
240件

不合格
0件

③ 后道加工单

本单后道项目 开扣眼

装扣子

后道加工单

■ 演示POST-SWT-A-01-0101-已入库-2

后道完成
后道完成 10-03 16:14
开始 10-03 16:06
加工 耗时8分钟·要求未确认
后道吴芳 → 后道李梅

应处理
240件

已处理
240件

已确认未处理
0件

④ 处理后交出复核

后道复检单

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-已入库-2-recheck

复检完成
复检完成 10-03 16:19
开始 10-03 16:15
数量与条码复核 耗时4分钟·要求未确认
复检周燕 → 后道李梅

应交出
240件

复核交出
240件

数量差异
0件

⑤ 交货 / 实际交出

后道交货单

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-已入库-2-delivery

成衣仓已接收
成衣仓接收 10-05 10:00
交出 10-03 16:20
交接 耗时1天17小时40分钟·要求未确认
后道李梅 → 成衣仓周婷

应交
240件

实交
240件

实收
240件

⑥ 成衣仓接收

成衣仓入库单

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-已入库-2-inbound

已入库
实际入库 10-05 10:00
后道李梅 → 成衣仓周婷

本批实收入库
240件

已入库-3·240件

成衣仓已入库

来源任务 SWT-A-01-0101

无需后道加工；质检后直接交成衣仓

① 后道收货

后道实收记录

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-已入库-3-receive

已实收
后道实收 10-04 12:00
赵亮 → 后道李梅

本批次实收
240件

来源记录实收
240件

② 质检

后道质检单

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-已入库-3-qc

质检完成
质检完成 10-04 12:05
开始 10-04 12:01

质检 耗时4分钟 · 要求未确认
质检陈芳 → 后道李梅

应检
240件

已检
240件

合格
240件

不合格
0件

③ 交货 / 实际交出

后道交货单

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-已入库-3-delivery

成衣仓已接收
成衣仓接收 10-05 10:00
交出 10-04 12:11

交接 耗时21小时49分钟 · 要求未确认
后道李梅 → 成衣仓周婷

应交
240件

实交
240件

实收
240件

④ 成衣仓接收

成衣仓入库单

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-已入库-3-inbound

已入库
实际入库 10-05 10:00
后道李梅 → 成衣仓周婷

本批次实收入库
240件

A-04-processing-4 · 90件

后道加工中

来源任务 SWT-A-01-0101

① 后道收货

后道实收记录

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-A-04-processing-4-receive

已实收
后道实收 10-06 14:00
赵亮 → 后道李梅

本批次实收
90件

来源记录实收
240件

② 质检

后道质检单

■ 演示FF-post-SWT-A-01-0101-A-04-processing-4-qc

质检完成
质检完成 10-06 14:09
开始 10-06 14:05

质检 耗时4分钟 · 要求未确认
质检陈芳 → 后道李梅

应检
90件

已检
90件

合格
90件

不合格
0件

③ 后道加工单

本单后道项目 开扣眼
装扣子

后道加工单

■ 演示POST-SWT-A-01-0101-A-04-processing-4

后道中
后道开始 10-06 14:10
加工 已用18小时50分钟 · 要求未确认
后道吴芳 → 后道李梅

应处理
90件

已处理
0件

已确认未处理
0件

④ 处理后交出复核

后道加工未完成 · 复核单尚未生成

⑤ 交货 / 实际交出

前置尚未完成 · 交货单尚未生成

⑥ 成衣仓接收

前置尚未完成 · 成衣仓入库单尚未生成

90件尚待记录处理结果

A-04-processing-5 · 60件

后道加工中

来源任务 SWT-C-01-0101



每批仅计一个当前位置；后道项目共用一张加工单的数量和起止时间。加工与交接分别计时，时效要求未确认。

成衣仓入库	最近入库, 累计			入库目标 1500件	成衣仓周婷实收确认 查看入库凭据
· 累计480 / 应完成1500件	480件 · 10-05 10:00				

合同按各任务业务分配日期起算；加工与交接分别计时。未确认时效要求的工作只显示用时。

工厂产前版样衣 · 与回货分别计时

领料后的第3天 · 样衣结果不改变合同节点

A厂 SWT-A-01-0101

实领
09-30 10:00

→ 要求交出
2026-10-03

→ 已在要求日期内交出
10-02 10:00

■ 演示PP-SAMPLE-SWT-A-01-101 已交出 · 已通过

赵亮执行 → 技术张琳接收确认

B厂 SWT-B-01-0101

实领
10-01 10:00

→ 要求交出
2026-10-04

→ 已在要求日期内交出
10-03 10:00

■ 演示PP-SAMPLE-SWT-B-01-101 已交出 · 已通过

陈强执行 → 技术张琳接收确认

B厂 SWT-C-01-0101

实领
10-03 10:00

→ 要求交出
2026-10-06

→ 已在要求日期内交出
10-05 10:00

■ 演示PP-SAMPLE-SWT-C-01-101 已交出 · 已通过

陈强执行 → 技术张琳接收确认

超时工作影响到哪里

只标明确关联；整单按期风险待负责人核实

B厂 SWT-B-01-0101 · 30%节点未达标 · 已超时9小时 ■ 演示ALLOC-SWT-B-01-101

→ 该节点还差150件；本任务后道尚未实收500件
受影响对象 / 数量范围

→ 对应任务后道实收 → 适用后道加工 → 成衣仓
陈强执行 → 李梅接收；不影响其他任务的已实收判断

按明确对象和下游记录跟进，已结束的时钟只保留历史。当前超时不自动判定裁片放行或其他任务停工。

整单仍按 2026-10-18 09:00 全部入成衣仓判断 · 无可靠预计完成时间时，不预测整单必然逾期。

当前跟进3项 · 资料核实0项 陈强执行 → 李梅接收；该合同节点未达标 · 已超时9小时；下一节点70%截止10-09 23:59

展开完整跟进清单

采购依据 时效口径

演示数据 · 查看时点 2026-10-07 09:00（北京时间）。
