

生产时效监控



生产单 PO-202610-0089

演示款蓝白印花衬衫 · SPU-SHIRT-086 · 跟单陈静 · 1张采购单 / 查看起算依据

业务核实截至 10-07 09:00 (演示)
假设演示 · 三阶段超时 / 影响范围

全部入成衣仓截止 · 最早采购下单 + 28自然日

2026-10-18 09:00

还剩11天；整单按期把握待核实

成衣仓已入库 / 应完成

0 / 1500件

剩余1500件需入库

当前优先处理

袖片绣花 · 当前逾期1天 / 剩余600片

10-07 08:30，阿琳反馈完成2400片，余600片安排待核实。

数量现在在哪里

成衣应完成1500件 · 裁片数量单独在工艺图看

尚未下发车缝任务

1500件

本演示核实未分配、未领料



工厂尚未回

0件

未下发任务，没有工厂实领



后道加工 / 交接

0件

本演示尚未进入后道



成衣仓已入库

0件

仓库入库已核实为0件

1500件 = 未下发车缝1500 + 工厂0 + 后道0 + 交接0 + 入库0；工艺图中的片数不能加进这里。

生产准备

已知时效项无当前逾期

1项逾期完成 · 最长1天

阶段整体4自然日；支线不累加

查看阶段图与对应单据 ↓

面辅料供给

已知时效项无当前逾期

1项逾期完成 · 最长2天

物料采购下单→面辅料仓入库8自然日

查看阶段图与对应单据 ↓

裁片辅助工艺

1项当前逾期 · 最长1天

1项逾期完成 · 最长1天

辅助工艺每道3自然日；交接另计

查看阶段图与对应单据 ↓

收起全部阶段链路

阶段展开查看对象、单据、制作与交接；三种角色同屏读图

全程时效图

■ 红色延伸 = 超时 逾期完成 = 历史延误 当前逾期 = 仍需处理

阶段 / 工作	09-20 D0	09-24 D4	09-28 D8	10-07 查看时点	10-18 入库截止	经办与交接责任
生产准备 6条准备链路 · 阶段整体4天	要求4天	逾期完成 超1天 09-25				张琳完成 · 陈静核对 收起生产准备链路

已知时效项无当前逾期

1项逾期完成 · 最长1天

阶段整体4自然日；支线不累加

生产准备 · 单据与交接链路

收起本阶段链路 ↑

生产准备单、BOM物料明细、前期输入及适用任务；无定位印，整体要求4天

生产准备单

! 逾期完成 1天

截止 09-24 09:00 · 实际完成 09-25 09:00

■ 演示PP-0089-89

已关闭 · 1单

关闭 09-25 09:00

开始 09-20 09:00

准备阶段 已用5天 · 要求4自然日

技术张琳 → 跟单陈静

BOM物料明细

■ 演示PP-0089 · BOM明细-89

已确认 · 5项

确认 09-20 09:05

张琳 → 买手陈静

设计改款任务

■ 演示DR-086-89

已完成 · 1套

确认 09-19 17:00

版师梁敏 → 技术张琳

F01 主面料 · 蓝底
C01 · 技术调色准备

颜色要求

■ 演示PP-0089 · BOM明细-89

已确认 · 5项



工厂调色 / 交出色样

■ 演示COLOR-C01-89

已完成 · 1色样

制作 09-21 09:00 → 09-22 14:40

制作 已用1天5小时40分钟 · 标准待配置

交接 09-22 15:00 → 09-22 15:30

交接 已用30分钟 · 标准待配置

染厂阿迪执行 → 技术张琳接收确认

→

成果接收 / 确认

■ 演示COLOR-C01-89

已完成 · 1色样

确认 09-23 10:00

染厂阿迪执行 → 技术张琳接收确认

F02 捆条布 · 藏青
C02 · 技术调色准备

颜色要求

■ 演示PP-0089 · BOM明细-89

已确认 · 5项

→

工厂调色 / 交出色样

■ 演示COLOR-C02-89

已完成 · 1色样

制作 09-21 09:00 → 09-22 14:30

制作 已用1天5小时30分钟 · 标准待配置

交接 09-22 15:00 → 09-22 15:30

→

成果接收 / 确认

■ 演示COLOR-C02-89

已完成 · 1色样

确认 09-22 17:00

染厂阿迪执行 → 技术张琳接收确认

交接 已用30分钟 · 标准待配置
染厂阿迪执行 → 技术张琳接收确认

花型要求

■ 演示PP-0089 · BOM明细-89

已确认 · 5项



花型设计 / 交出图稿

■ 演示ART-P01-89

已完成 · 1套

制作 09-21 10:00 → 09-22 15:40
制作 已用1天5小时40分钟 · 标准待配置

交接 09-22 16:00 → 09-22 16:20
交接 已用20分钟 · 标准待配置

花型小雨执行 → 技术张琳 / 买手陈静接收确认



成果接收 / 确认

■ 演示ART-P01-89

已完成 · 1套

确认 09-23 11:00
花型小雨执行 → 技术张琳 / 买手陈静接收确认

F01 主身 · 花型A
P01 · 印花技术准备

花型要求

■ 演示PP-0089 · BOM明细-89

已确认 · 5项



花型设计 / 交出图稿

■ 演示ART-P02-89

已完成 · 1套

制作 09-21 10:00 → 09-22 15:30
制作 已用1天5小时30分钟 · 标准待配置

交接 09-22 16:00 → 09-22 16:20
交接 已用20分钟 · 标准待配置

花型小雨执行 → 技术张琳 / 买手陈静接收确认



成果接收 / 确认

■ 演示ART-P02-89

已完成 · 1套

确认 09-23 12:00
花型小雨执行 → 技术张琳 / 买手陈静接收确认

F01 袖口 · 花型B
P02 · 印花技术准备

采购要求

■ 演示PP-0089 · BOM明细-89

已确认 · 5项

辅料下单任务

■ 演示ACCESSORY-086-89

已完成 · 2项

对应采购单已绑定

■ 演示MP-A02-89

已收齐入库 · 300米

采购到仓 09-20 14:00 → 09-25 11:00

辅料下单 · 2项有效需求

适用成果汇合 →



技术包确认任务

■ 演示TP-TASK-086-89

已完成 · 1套

确认 09-25 08:30
技术张琳 → 跟单陈静



正式技术包

■ 演示TP-086-V11-89

已发布 · 1版本

发布 09-25 09:00
张琳汇总 → 陈静发布

适用有效明细全部完成后汇合；未启用 / 需求变更结束项不当作当前欠项。

采购覆盖2/2 · 绑定实际采购单



采购到仓 已用4天21小时 · 要求8自然日

■ 演示MP-A03-89

已收齐入库 · 1000个

采购到仓 09-20 15:00 → 09-27 15:00

采购到仓 已用7天 · 要求8自然日

并行

前期已确认基码

■ 演示DR-086-89

已完成 · 1套

打版 / 首单样衣 · 本单M-XL

基码前期复用，两个专业任务可并行

首单样衣任务

■ 演示SAMPLE-086-89

已完成 · 1件

制作完成 09-23 13:20

开始 09-21 09:00

制作 已用2天4小时20分钟 · 标准待配置

制作Dewi → 技术张琳

交接 09-23 13:30 → 09-23 14:00

交接 已用30分钟 · 标准待配置

梭织齐码纸样任务

■ 演示SIZE-086-89

已完成 · 1套

制作完成 09-22 17:20

开始 09-21 09:00

制作 已用1天8小时20分钟 · 标准待配置

版师梁敏 → 技术张琳

交接 09-22 17:30 → 09-22 18:00

交接 已用30分钟 · 标准待配置

调色是技术准备；辅料下单任务绑定采购单后满足，不代表物料已入库。支线制作和交接分别计时，不增加审版时段。

面料辅料供给

5项物料 · 库存/补采
分别跟进

采购8天

F01逾期入仓

超2天
09-30

赵敏采购 → 周婷入仓确认
[收起面料辅料供给链路](#)

已知时效项无当前逾期

1项逾期完成 · 最长2天

物料采购下单→面辅料仓入库8自然日

面辅料供给 · 单据与交接链路

收起本阶段链路 ↑

每项物料先看需求和来源，按下游实收汇合，再按实际全量或分批加工单推进

主面料白坯布

物料 F01

主身 / 袖口 · 蓝底花型A/B

需求 1500米

= 库存采用 600米 + 补采 900米

① 库存采用
600米

下单时库存 600米

原料调拨单

■ 演示TR-F01-STOCK-89

已接收 · 600米

下游接收 09-30 14:00

交出 09-30 13:00

交接 已用1小时 · 标准待配置

面料仓周婷 → 染色厂阿迪

② 缺口补采
900米

国内采购

物料采购单

! 逾期完成 2天

截止 09-28 12:00 · 实际完成 09-30 12:00

■ 演示MP-F01-89

已收齐入库 · 900米

仓库入库 09-30 12:00

下单 09-20 12:00

采购到仓 已用10天 · 要求8自然日

采购赵敏 → 面料仓周婷

原料入库单

■ 演示IN-F01-89

已入库 · 900米

接收入库 09-30 12:00

面料仓周婷 → 面料仓周婷

原料调拨单

■ 演示TR-F01-PURCHASE-89

已接收 · 900米

下游接收 09-30 14:10

交出 09-30 13:10

交接 已用1小时 · 标准待配置

面料仓周婷 → 染色厂阿迪

染色厂阿迪已实收

1500米

600 + 900 = 1500
米

09-30 14:10

↓ 本例采用全量加工单；实际可按已接收批次分别推进；各道数量分别记录



1 · 大货染色加工单

大货染色加工单

■ 演示WO-F02-DYE-89

加工完成 · 150米

加工完成 09-26 16:00

开始 09-25 10:00

加工 已用1天6小时 · 标准待配置

染色厂阿迪 → 裁床刘军

↓ 交出与下游实收

染色厂阿迪 → 裁床刘军

已接收

■ 演示HO-F02-DYE-89

■ 交出记录

■ 接收记录

■ 质检交接记录

交出 09-26 16:10 · 150米

实收 09-26 16:40 · 150米 · 差异0米

交接 已用30分钟 · 标准待配置


纽扣

物料 A01

需求 9000粒

蓝白款配套 · 无后续加工

= 库存采用 9000粒 + 补采 0粒

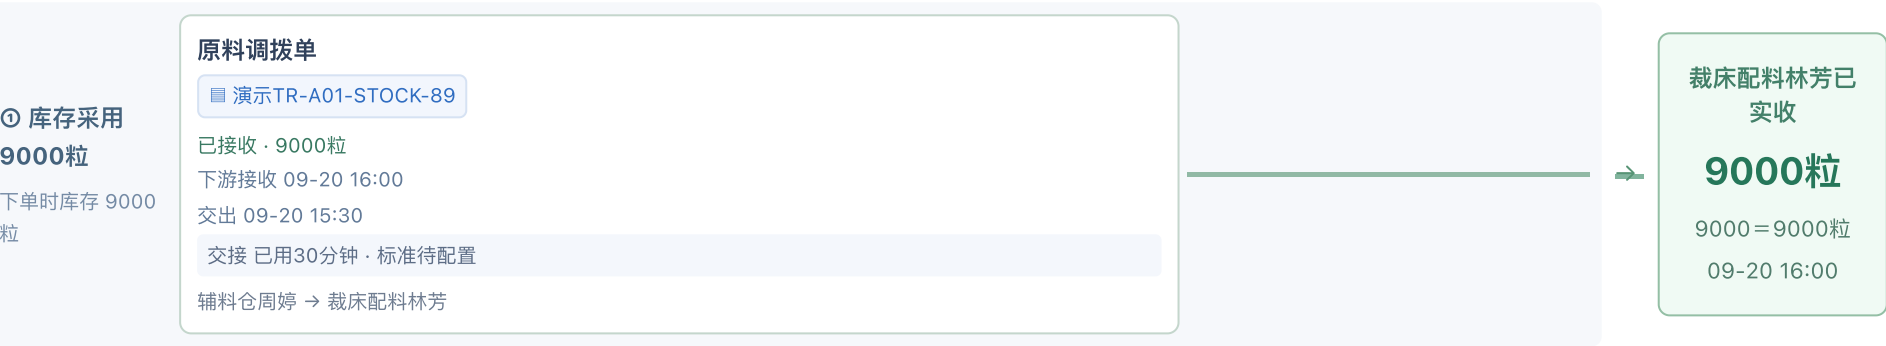

✓ 无需大货加工 · 实收后进入对应配料工作

衬布

物料 A02

需求 300米

领 / 门襟 · 无后续加工

= 库存采用 0米 + 补采 300米



✓ 无需大货加工 · 实收后进入对应配料工作

织标

物料 A03

需求 1500个

本款织标 · 无后续加工

= 库存采用 500个 + 补采 1000个

① 库存采用
500个
下单时库存 500个

原料调拨单

■ 演示TR-A03-STOCK-89

已接收 · 500个
下游接收 09-27 16:00
交出 09-27 15:30
交接 已用30分钟 · 标准待配置
辅料仓周婷 → 裁床配料林芳

② 缺口补采
1000个
自有辅料工厂

物料采购单

✓ 按期完成

截止 09-28 15:00 · 实际完成 09-27 15:00

■ 演示MP-A03-89

已收齐入库 · 1000个
仓库入库 09-27 15:00
下单 09-20 15:00
采购到仓 已用7天 · 要求8自然日
采购赵敏 → 辅料仓周婷

原料入库单

■ 演示IN-A03-89

已入库 · 1000个
接收入库 09-27 15:00
辅料仓周婷 → 辅料仓周婷

原料调拨单

■ 演示TR-A03-PURCHASE-89

已接收 · 1000个
下游接收 09-27 16:10
交出 09-27 15:10
交接 已用1小时 · 标准待配置
辅料仓周婷 → 裁床配料林芳

裁床配料林芳已
实收

1500个

500 + 1000 = 1500
↑
09-27 16:10

✓ 无需大货加工 · 实收后进入对应配料工作

白坯布是加工前原料；蓝底、花型A/B是目标效果。采购数量不能直接算作已供给，以仓库及下游接收记录为准。米、粒、个不相加为成衣件数。

裁剪 / 辅助工艺

4个部位 · 无需/单道/
多道

3天

应完成

逾期1天
10-06

阿琳执行 → 刘军接收 · 王明跟进
收起裁片辅助工艺链路

1项当前逾期 · 最长1天

1项逾期完成 · 最长1天

辅助工艺每道3自然日；交接另计

裁片辅助工艺 · 单据与交接链路

每个部位 / 批次有裁剪单，逐道加工单与工厂质检交接记录；辅助工艺每道3自然日

收起本阶段链路 ↑

前片 · 1500片

CUT-F-01

多道 · 绣花→打揽

裁剪单

■ 演示CUT-CUT-F-01-89

本部位已裁出 · 1500片
裁剪完成 10-02 20:00
裁床刘军 → 陈静 / 下游工厂

绣花加工单

✓ 按期完成



截止 10-05 20:30 · 实际完成 10-03 06:00

■ 演示AUX-CUT-F-01-EMB-89

加工完成 · 1500片
加工完成 10-03 06:00
开始 10-02 20:30

加工 已用9小时30分钟 · 要求3自然日

绣花厂阿琳 → 打揽厂阿迪

↓ 下游工厂实际接收后，开始下一道加工

打揽加工单

✓ 按期完成



截止 10-06 07:00 · 实际完成 10-03 12:00

■ 演示AUX-CUT-F-01-SMOCK-89

加工完成 · 1500片
加工完成 10-03 12:00
开始 10-03 07:00

加工 已用5小时 · 要求3自然日

打揽厂阿迪 → 裁床刘军



裁床刘军 → 绣花厂阿琳

已接收

■ 演示HO-CUT-F-01-FIRST-89 ■ 交出记录 ■ 接收记录 ■ 质检交接记录

交出 10-02 20:05 · 1500片
实收 10-02 20:20 · 1500片 · 差异0片
交接 已用15分钟 · 标准待配置

绣花厂阿琳 → 打揽厂阿迪

已接收

■ 演示HO-CUT-F-01-EMB-89 ■ 交出记录 ■ 接收记录 ■ 质检交接记录

交出 10-03 06:10 · 1500片
实收 10-03 06:40 · 1500片 · 差异0片
交接 已用30分钟 · 标准待配置

打揽厂阿迪 → 裁床刘军

已接收

■ 演示HO-CUT-F-01-SMOCK-89 ■ 交出记录 ■ 接收记录 ■ 质检交接记录

交出 10-03 12:10 · 1500片
实收 10-03 12:40 · 1500片 · 差异0片
交接 已用30分钟 · 标准待配置

后片 · 1500片

CUT-B-01

单道 · 绣花

裁剪单

■ 演示CUT-CUT-B-01-89

本部位已裁出 · 1500片
裁剪完成 10-02 20:00
裁床刘军 → 陈静 / 下游工厂



裁床刘军 → 绣花厂阿琳

已接收

■ 演示HO-CUT-B-01-FIRST-89 ■ 交出记录 ■ 接收记录 ■ 质检交接记录

交出 10-02 20:05 · 1500片
实收 10-02 20:20 · 1500片 · 差异0片
交接 已用15分钟 · 标准待配置

绣花加工单

! 逾期完成 1天



截止 10-05 20:30 · 实际完成 10-06 20:30

■ 演示AUX-CUT-B-01-EMB-89

加工完成 · 1500片
加工完成 10-06 20:30
开始 10-02 20:30
加工 已用4天 · 要求3自然日

绣花厂阿琳 → 裁床刘军



绣花厂阿琳 → 裁床刘军

已接收

■ 演示HO-CUT-B-01-EMB-89 ■ 交出记录 ■ 接收记录 ■ 质检交接记录

交出 10-06 20:40 · 1500片
实收 10-06 21:10 · 1500片 · 差异0片
交接 已用30分钟 · 标准待配置

袖片 · 3000片

CUT-S-01

多道 · 模版机→绣花

裁剪单

■ 演示CUT-CUT-S-01-89

本部位已裁出 · 3000片
裁剪完成 10-02 20:00
裁床刘军 → 陈静 / 下游工厂



裁床刘军 → 模版机厂林梅

已接收

■ 演示HO-CUT-S-01-FIRST-89 ■ 交出记录 ■ 接收记录 ■ 质检交接记录

交出 10-02 20:05 · 3000片
实收 10-02 20:20 · 3000片 · 差异0片
交接 已用15分钟 · 标准待配置

模版机加工单

✓ 按期完成



截止 10-05 20:30 · 实际完成 10-03 08:00

■ 演示AUX-CUT-S-01-TEMPLATE-89

加工完成 · 3000片
加工完成 10-03 08:00



模版机厂林梅 → 绣花厂阿琳

已接收

■ 演示HO-CUT-S-01-TEMPLATE-89 ■ 交出记录 ■ 接收记录 ■ 质检交接记录

交出 10-03 08:10 · 3000片
实收 10-03 08:40 · 3000片 · 差异0片
交接 已用30分钟 · 标准待配置

开始 10-02 20:30

加工 已用11小时30分钟 · 要求3自然日

模版机厂林梅 → 绣花厂阿琳

↓ 下道工厂实际接收后，开始下一道加工

绣花加工单

! 当前逾期 1天

截止 10-06 09:00 · 仍未完成，截至 10-07 09:00

■ 演示AUX-CUT-S-01-EMB-89

加工中 · 3000片

加工开始 10-03 09:00

开始 10-03 09:00

加工 已用4天 · 要求3自然日

绣花厂阿琳 → 裁床刘军



未交出 · 交接尚未开始

完成量2400片 / 应加工3000片；本工序剩余600片

阿琳执行 → 裁床刘军接收确认

领片 · 1500片

CUT-C-01

无需辅助工艺

裁剪单

■ 演示CUT-CUT-C-01-89

本部位已裁出 · 1500片

裁剪完成 10-02 19:00

裁床刘军 → 陈静 / 下游工厂

无需辅助工艺 → 仍由业务人员人工放行

本演示已核实：尚未办理裁片放行，没有车缝任务分配。是否分批放行由业务人员在原页面决定。

上道工厂交出与下道实际接收分别记录。无需工艺也不自动视为已放行；片数不相加为成衣完成量。

· 车缝任务 本演示尚未分配	未分配，尚无合同计时起点						王明核对实际分配 查看当前数量
· 成衣仓入库 已核实0 / 应完成1500件	尚未入库 · 整单截止10-18 09:00						成衣仓周婷确认 查看实际入库依据

这是独立超时示例：准备、采购时钟已结束，袖片绣花仍在进行。交接标准未确认，不自行判交接逾期。

超时工作影响到哪里

只标明确关联；整单按期风险待负责人核实



未确认的成衣件数保持待核实 · 600袖片不换算为600件成衣，不把整单1500件全部标为受阻。前片、领片等独立部位按自己的实际记录推进。王明11:00核对受影响颜色/尺码与放行范围；陈静在裁片放行管理手动决定。

整单仍按 2026-10-18 09:00 全部入成衣仓判断 · 无可靠预计完成时间时，不预测整单必然逾期。

当前跟进1项 · 资料核实0项 10-07 08:30，阿琳反馈完成2400片，余600片安排待核实。

展开完整跟进清单

一线看对象与动作 · 主管看影响和跟进 · 高管看整单目标与结果

采购依据 时效口径

固定演示查看时点 2026-10-07 09:00（北京时间）；演示数量、人员和时间用于验证展示方式。点击单据先查看核心信息，再在新标签页查看原模块详情。
